Activity ID	Start	Finish	BL Project Finish
Wind Farm	02-Ja	12-Ap	12-Ap
Milestones	02-Ja	12-Ap	12-Ap
BLFI		30-M	30-Ma
CMCR001	20-Fe	25-Fe	25-Fe
COD		12-Ap	12-Ap
FOUNDF		25-Fe	25-Fe
NTP	02-Ja		
Manufactu	09-Ja	11-Fe	11-Fe
Nacelle	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MANA001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MANA002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MANA003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MANA004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MANA005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Blades	09-Ja	11-Fe	11-Fe
MABL001	09-Ja	14-Ja	14-Ja
MABL002	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MABL003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MABL004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MABL005	06-Fe	11-Fe	11-Fe
Tower	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MAST002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Logistics	06-Fe	15-M	15-Ma
Shipping	06-Fe	25-Fe	25-Fe
Nacelle	06-Fe	18-Fe	18-Fe
SHNA001	06-Fe	18-Fe	18-Fe
Blades	13-Fe	25-Fe	25-Fe
SHBL001	13-Fe	25-Fe	25-Fe
Tower	06-Fe	18-Fe	18-Fe
SHST001	06-Fe	18-Fe	18-Fe
Site Delivery	20-Fe	15-M	15-Ma
Nacelle	20-Fe	08-M	08-Ma
SDNA001	20-Fe	22-Fe	22-Fe
SDNA002	23-Fe	25-Fe	25-Fe
SDNA003	27-Fe	01-M	01-Ma
SDNA004	02-Ma	04-M	04-Ma
SDNA005	06-Ma	08-M	08-Ma
Blades	27-Fe	15-M	15-Ma
SDBL001	27-Fe	01-M	01-Ma
SDBL002	02-Ma	04-M	04-Ma
SDBL003	06-Ma	08-M	08-Ma
SDBL004	09-Ma	11-Ma	11-Ma
SDBL005	13-Ma	15-M	15-Ma
Tower	20-Fe	08-M	08-Ma
SDST001	20-Fe	22-Fe	22-Fe
SDST002	23-Fe	25-Fe	25-Fe
SDST003	27-Fe	01-M	01-Ma
SDST004	02-Ma	04-M	04-Ma
SDST005	06-Ma	08-M	08-Ma
Installation	13-Fe	12-Ap	12-Ap
Foundation a	13-Fe	25-Fe	25-Fe
FNPL001	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL002	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL003	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL004	20-Fe	25-Fe	25-Fe
FNPL005	20-Fe	25-Fe	25-Fe
Main Erectio	27-Fe	01-Ap	01-Ap
INDS001	03-Ma	04-M	04-Ma
INDS002	10-Ma	11-Ma	11-Ma
INDS003	17-Ma	18-M	18-Ma
INDS004	24-Ma	25-M	25-Ma
INDS005	31-Ma	01-Ap	01-Ap
INTE001	27-Fe	02-M	02-Ma
INTE002	06-Ma	09-M	09-Ma
INTE003	13-Ma	16-M	16-Ma
INTE004	20-Ma	23-M	23-Ma
INTE005	27-Ma	30-M	30-Ma
Mechanical W	03-Ma	05-Ap	05-Ap
INMW001	03-Ma	08-M	08-Ma
INMW002	10-Ma	15-M	15-Ma
INMW003	17-Ma	22-M	22-Ma
INMW004	24-Ma	29-M	29-Ma
INMW005	31-Ma	05-Ap	05-Ap
Final Inspect	09-Ma	08-Ap	08-Ap
INSP001	09-Ma	11-Ma	11-Ma
INSP002	16-Ma	18-M	18-Ma
INSP003	23-Ma	25-M	25-Ma
INSP004	30-Ma	01-Ap	01-Ap
INSP005	06-Ap	08-Ap	08-Ap
Commission	13-Ma	12-Ap	12-Ap
COMM001	13-Ma	15-M	15-Ma
COMM002	20-Ma	22-M	22-Ma
COMM003	27-Ma	29-M	29-Ma
COMM004	03-Ap	05-Ap	05-Ap
COMM005	10-Ap	12-Ap	12-Ap

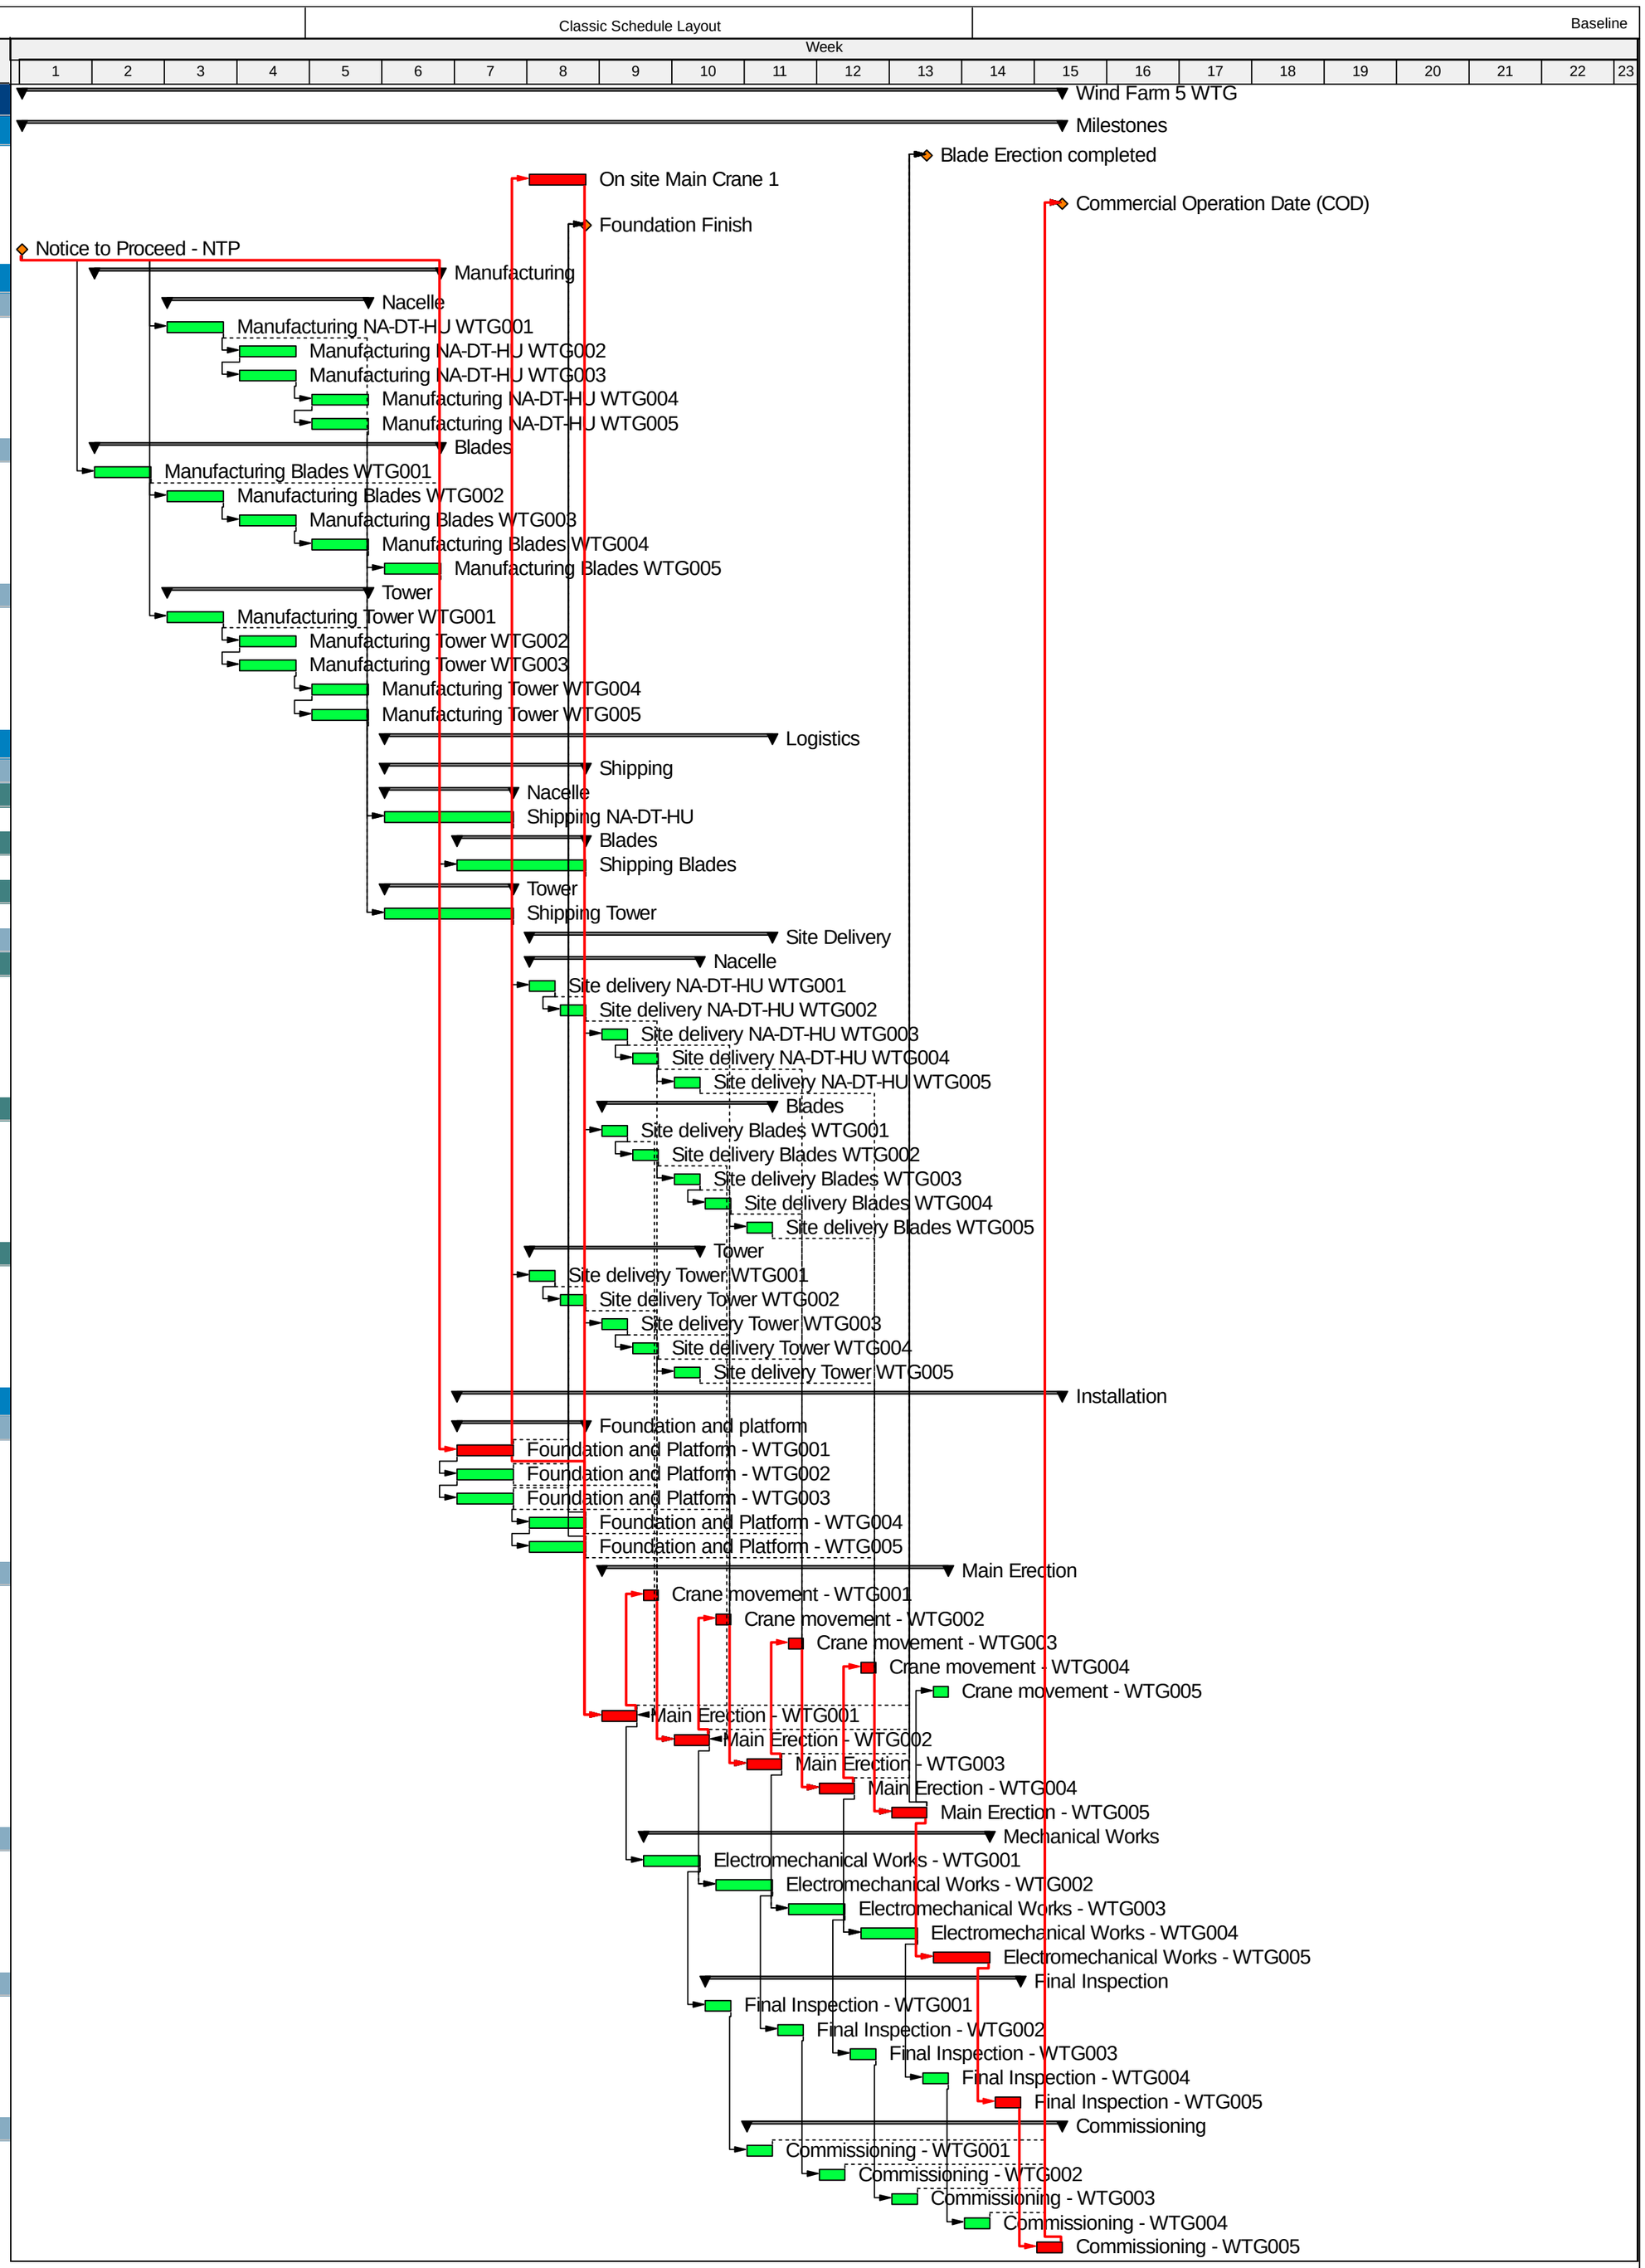

© Oracle Corporation
