Activity ID	Start	Finish	BL Project Finish
Collapsed	02-Ja	29-Ap	12-Ap
Milestones	02-Ja	29-Ap	12-Ap
BLFI		12-Ap	30-Ma
CMCR001	20-Fe	25-Fe	25-Fe
COD		29-Ap	12-Ap
FOUNDF		04-M	25-Fe
NTP	02-Ja		
Manufactu	09-Ja	11-Fe	11-Fe
Nacelle	16-Ja	11-Fe	04-Fe
MANA001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MANA002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MANA003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MANA004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MANA005	06-Fe	11-Fe	04-Fe
MANADR	23-Ja	23-Ja	
Blades	09-Ja	11-Fe	11-Fe
MABL001	09-Ja	14-Ja	14-Ja
MABL002	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MABL003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MABL004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MABL005	06-Fe	11-Fe	11-Fe
MABLDR2	09-Ja	09-Ja	
Tower	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MAST002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Logistics	06-Fe	15-M	15-Ma
Shipping	06-Fe	25-Fe	25-Fe
Nacelle	13-Fe	25-Fe	18-Fe
SHNA001	13-Fe	25-Fe	18-Fe
Blades	13-Fe	25-Fe	25-Fe
SHBL001	13-Fe	25-Fe	25-Fe
SHBLDR	13-Fe	13-Fe	
Tower	06-Fe	18-Fe	18-Fe
SHST001	06-Fe	18-Fe	18-Fe
SHSTDR	06-Fe	06-Fe	
Site Delivery	20-Fe	15-M	15-Ma
Nacelle	27-Fe	15-M	08-Ma
SDNA001	27-Fe	01-M	22-Fe
SDNA002	02-Ma	04-M	25-Fe
SDNA003	06-Ma	08-M	01-Ma
SDNA004	09-Ma	11-Ma	04-Ma
SDNA005	13-Ma	15-M	08-Ma
Blades	27-Fe	15-M	15-Ma
SDBL001	27-Fe	01-M	01-Ma
SDBL002	02-Ma	04-M	04-Ma
SDBL003	06-Ma	08-M	08-Ma
SDBL004	09-Ma	11-Ma	11-Ma
SDBL005	13-Ma	15-M	15-Ma
Tower	20-Fe	01-M	08-Ma
SDST001	20-Fe	22-Fe	22-Fe
SDST002	20-Fe	22-Fe	25-Fe
SDST003	23-Fe	25-Fe	01-Ma
SDST004	23-Fe	25-Fe	04-Ma
SDST005	27-Fe	01-M	08-Ma
Installation	13-Fe	29-Ap	12-Ap
Foundation a	13-Fe	04-M	25-Fe
FNPL001	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL002	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL003	20-Fe	25-Fe	18-Fe
FNPL004	27-Fe	04-M	25-Fe
FNPL005	27-Fe	04-M	25-Fe
FNPLDR5	13-Fe	13-Fe	
Main Erectio	02-Ma	14-Ap	01-Ap
INDS001	08-Ma	11-Ma	04-Ma
INDS002	21-Ma	22-M	11-Ma
INDS003	27-Ma	31-M	18-Ma
INDS004	06-Ap	08-Ap	25-Ma
INDS005	12-Ap	14-Ap	01-Ap
INTE001	02-Ma	08-M	02-Ma
INTE002	15-Ma	20-M	09-Ma
INTE003	22-Ma	25-M	16-Ma
INTE004	01-Ap	06-Ap	23-Ma
INTE005	08-Ap	12-Ap	30-Ma
INTEDR6	13-Ma	14-M	
INTEDR7	31-Ma	01-Ap	
Mechanical W	08-Ma	19-Ap	05-Ap
INMW001	08-Ma	20-M	08-Ma
INMW002	20-Ma	30-M	15-Ma
INMW003	27-Ma	05-Ap	22-Ma
INMW004	06-Ap	13-Ap	29-Ma
INMW005	12-Ap	19-Ap	05-Ap
Final Inspect	20-Ma	26-Ap	08-Ap
INSP001	20-Ma	10-Ap	11-Ma
INSP002	11-Ap	15-Ap	18-Ma
INSP003	15-Ap	19-Ap	25-Ma
INSP004	20-Ap	24-Ap	01-Ap
INSP005	25-Ap	26-Ap	08-Ap
Commission	11-Ap	29-Ap	12-Ap
COMM001	11-Ap	13-Ap	15-Ma
COMM002	15-Ap	19-Ap	22-Ma
COMM003	20-Ap	22-Ap	29-Ma
COMM004	25-Ap	27-Ap	05-Ap
COMM005	27-Ap	29-Ap	12-Ap

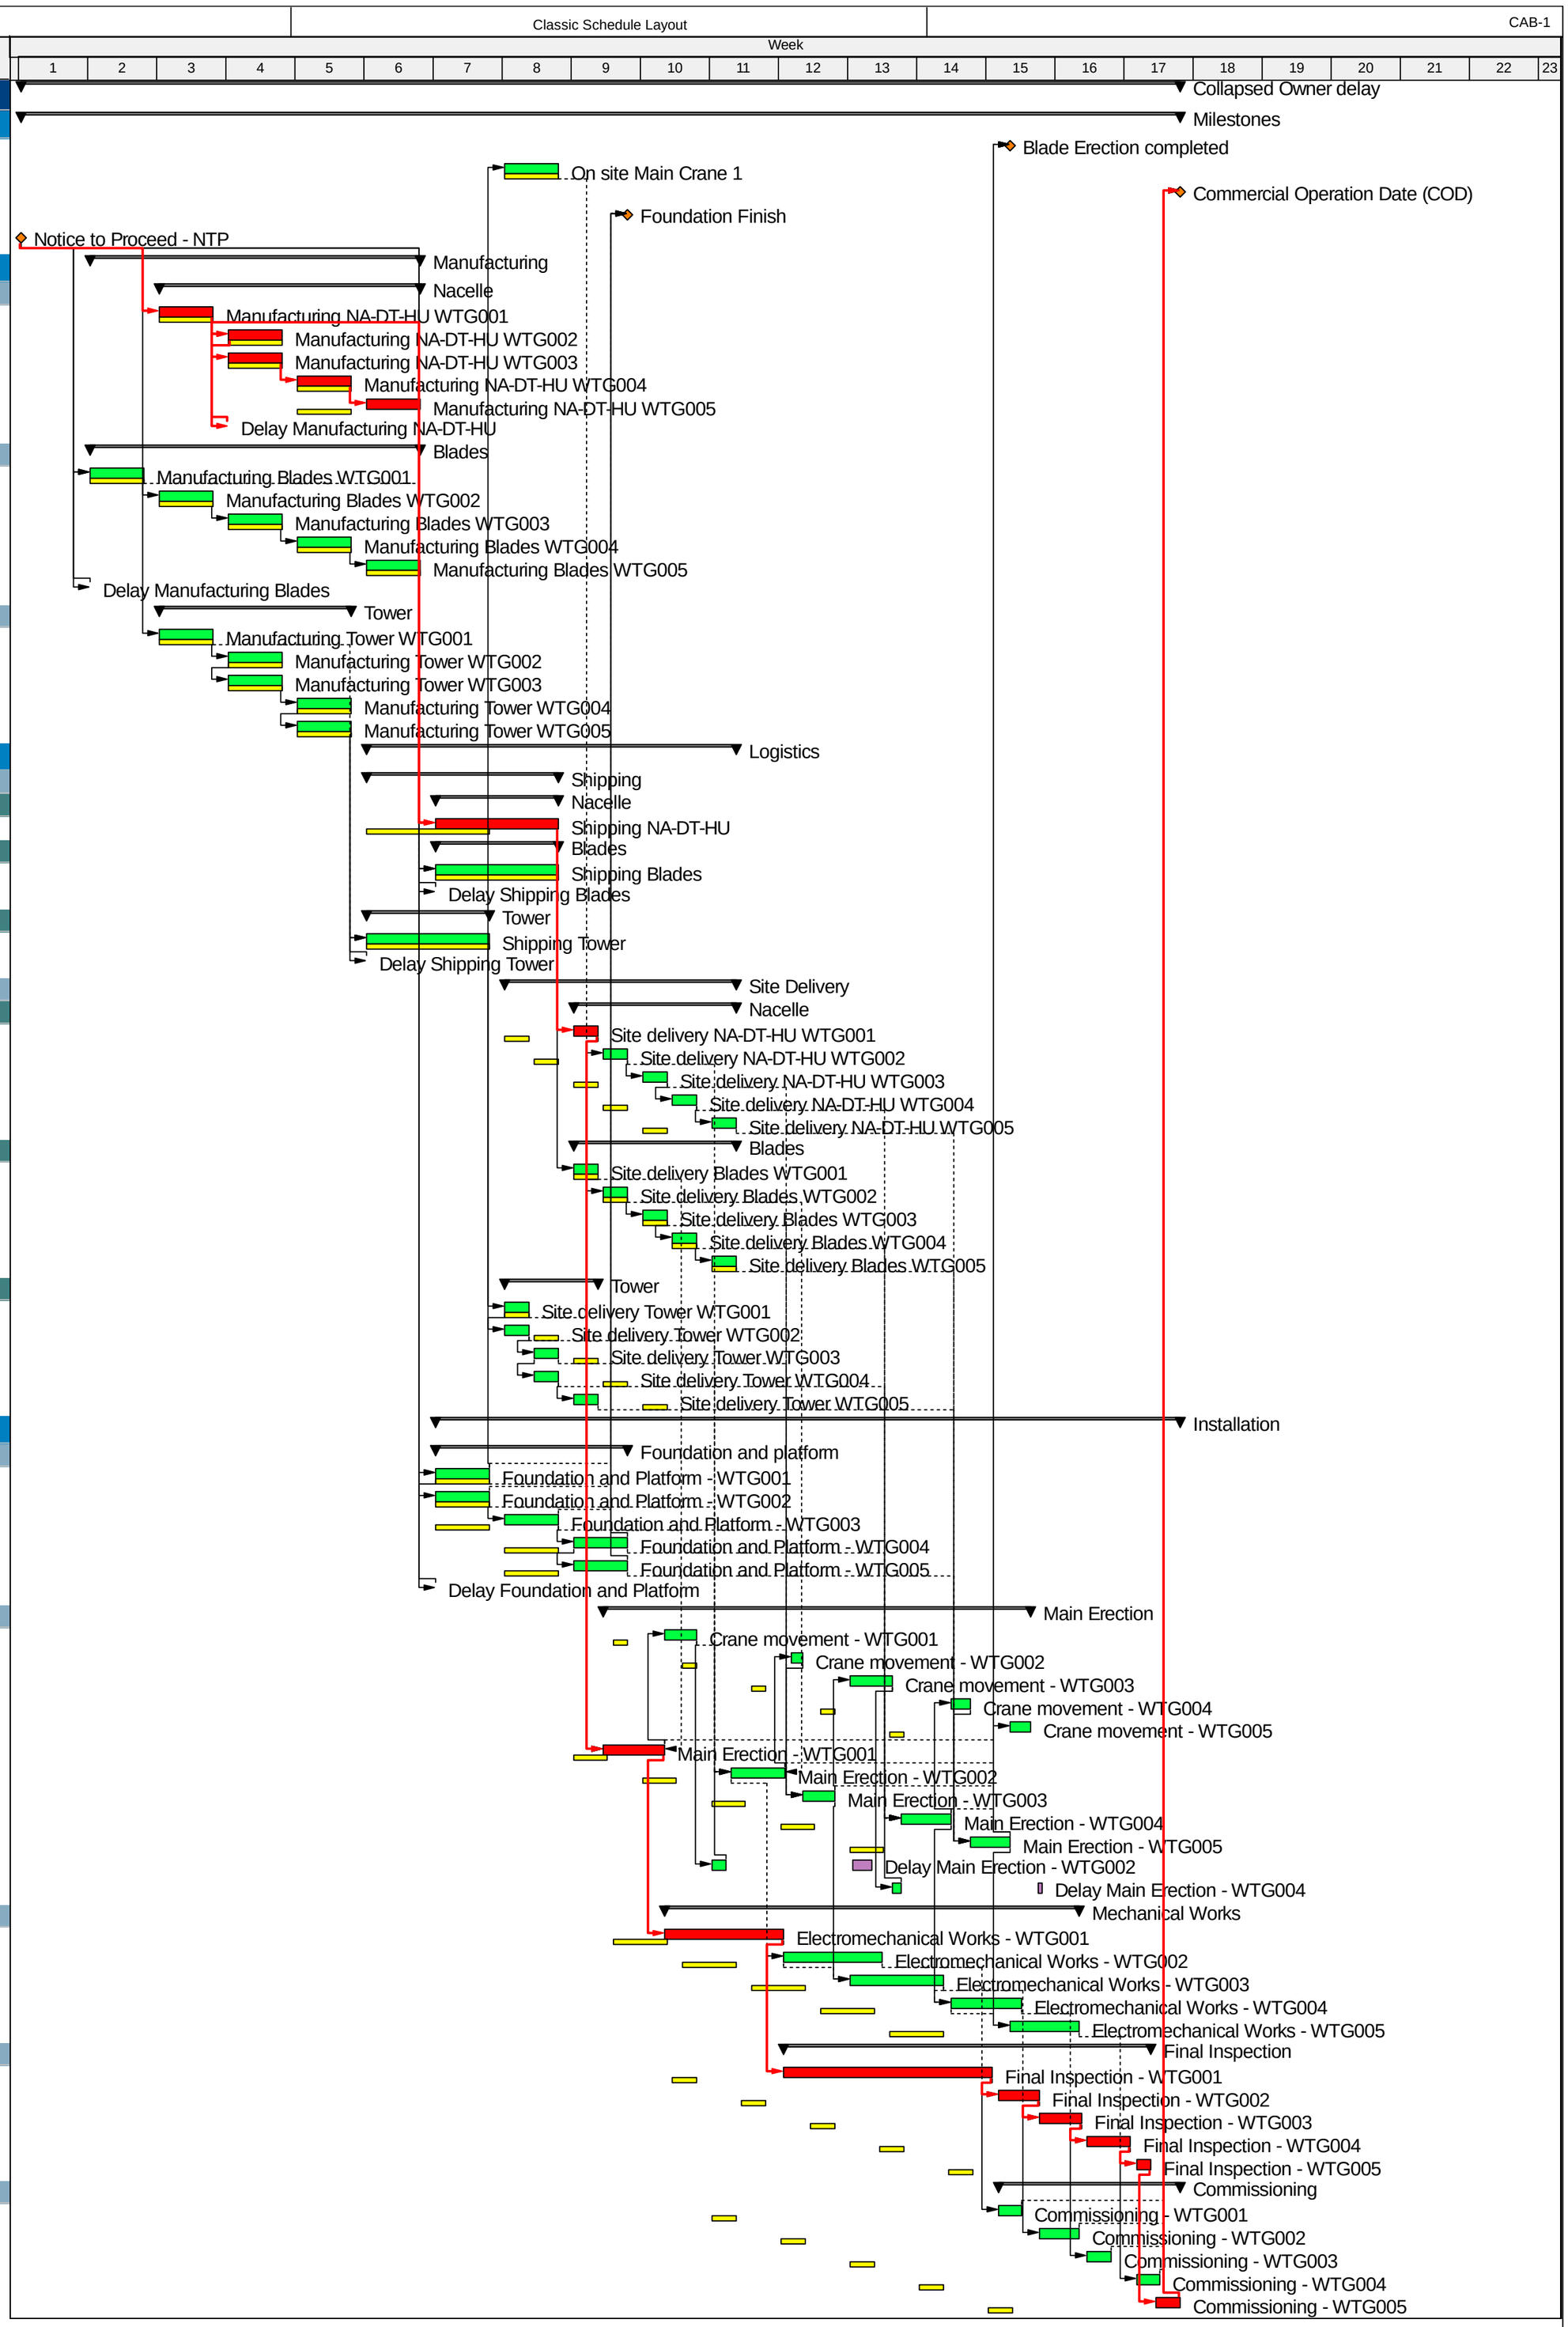

Actual Work | Critical Remaining Work | Milestone
Remaining Work | Primary Baseline | DELAY

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
