Activity ID	Start	Finish	BL Project Finish
Impacted A	02-Ja	05-M	12-Ap
Milestones	02-Ja	05-M	12-Ap
BLFI		22-Ap	30-Ma
CMCR001	06-Ma	11-Ma	25-Fe
COD		05-M	12-Ap
FOUNDF		11-Ma	25-Fe
NTP	02-Ja		
Manufactu	09-Ja	25-Fe	11-Fe
Nacelle	16-Ja	11-Fe	04-Fe
MANA001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MANA002	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA003	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA004	06-Fe	11-Fe	04-Fe
MANA005	06-Fe	11-Fe	04-Fe
MANADR	23-Ja	28-Ja	
Blades	09-Ja	25-Fe	11-Fe
MABL001	23-Ja	28-Ja	14-Ja
MABL002	30-Ja	04-Fe	21-Ja
MABL003	06-Fe	11-Fe	28-Ja
MABL004	13-Fe	18-Fe	04-Fe
MABL005	20-Fe	25-Fe	11-Fe
MABLDR2	09-Ja	21-Ja	
Tower	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MAST002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Logistics	06-Fe	05-Ap	15-Ma
Shipping	06-Fe	18-M	25-Fe
Nacelle	13-Fe	25-Fe	18-Fe
SHNA001	13-Fe	25-Fe	18-Fe
Blades	27-Fe	18-M	25-Fe
SHBL001	06-Ma	18-M	25-Fe
SHBLDR	27-Fe	04-M	
Tower	06-Fe	04-M	18-Fe
SHST001	20-Fe	04-M	18-Fe
SHSTDR	06-Fe	18-Fe	
Site Delivery	27-Fe	05-Ap	15-Ma
Nacelle	27-Fe	15-M	08-Ma
SDNA001	27-Fe	01-M	22-Fe
SDNA002	02-Ma	04-M	25-Fe
SDNA003	06-Ma	08-M	01-Ma
SDNA004	09-Ma	11-Ma	04-Ma
SDNA005	13-Ma	15-M	08-Ma
Blades	20-Ma	05-Ap	15-Ma
SDBL001	20-Ma	22-M	01-Ma
SDBL002	23-Ma	25-M	04-Ma
SDBL003	27-Ma	29-M	08-Ma
SDBL004	30-Ma	01-Ap	11-Ma
SDBL005	03-Ap	05-Ap	15-Ma
Tower	06-Ma	22-M	08-Ma
SDST001	06-Ma	08-M	22-Fe
SDST002	09-Ma	11-Ma	25-Fe
SDST003	13-Ma	15-M	01-Ma
SDST004	16-Ma	18-M	04-Ma
SDST005	20-Ma	22-M	08-Ma
Installation	13-Fe	05-M	12-Ap
Foundation a	13-Fe	11-Ma	25-Fe
FNPL001	27-Fe	04-M	18-Fe
FNPL002	27-Fe	04-M	18-Fe
FNPL003	27-Fe	04-M	18-Fe
FNPL004	06-Ma	11-Ma	25-Fe
FNPL005	06-Ma	11-Ma	25-Fe
FNPLDR5	13-Fe	25-Fe	
Main Erectio	18-Ma	25-Ap	01-Ap
INDS001	23-Ma	24-M	04-Ma
INDS002	01-Ap	03-Ap	11-Ma
INDS003	08-Ap	10-Ap	18-Ma
INDS004	17-Ap	18-Ap	25-Ma
INDS005	24-Ap	25-Ap	01-Ap
INTE001	18-Ma	22-M	02-Ma
INTE002	28-Ma	31-M	09-Ma
INTE003	04-Ap	07-Ap	16-Ma
INTE004	12-Ap	15-Ap	23-Ma
INTE005	19-Ap	22-Ap	30-Ma
INTEDR6	25-Ma	27-M	
INTEDR7	11-Ap	11-Ap	
Mechanical W	23-Ma	28-Ap	05-Ap
INMW001	23-Ma	28-M	08-Ma
INMW002	01-Ap	06-Ap	15-Ma
INMW003	08-Ap	13-Ap	22-Ma
INMW004	17-Ap	21-Ap	29-Ma
INMW005	24-Ap	28-Ap	05-Ap
Final Inspect	29-Ma	02-M	08-Ap
INSP001	29-Ma	31-M	11-Ma
INSP002	07-Ap	10-Ap	18-Ma
INSP003	14-Ap	17-Ap	25-Ma
INSP004	22-Ap	25-Ap	01-Ap
INSP005	29-Ap	02-M	08-Ap
Commission	01-Ap	05-M	12-Ap
COMM001	01-Ap	04-Ap	15-Ma
COMM002	11-Ap	13-Ap	22-Ma
COMM003	18-Ap	20-Ap	29-Ma
COMM004	26-Ap	28-Ap	05-Ap
COMM005	03-Ma	05-M	12-Ap

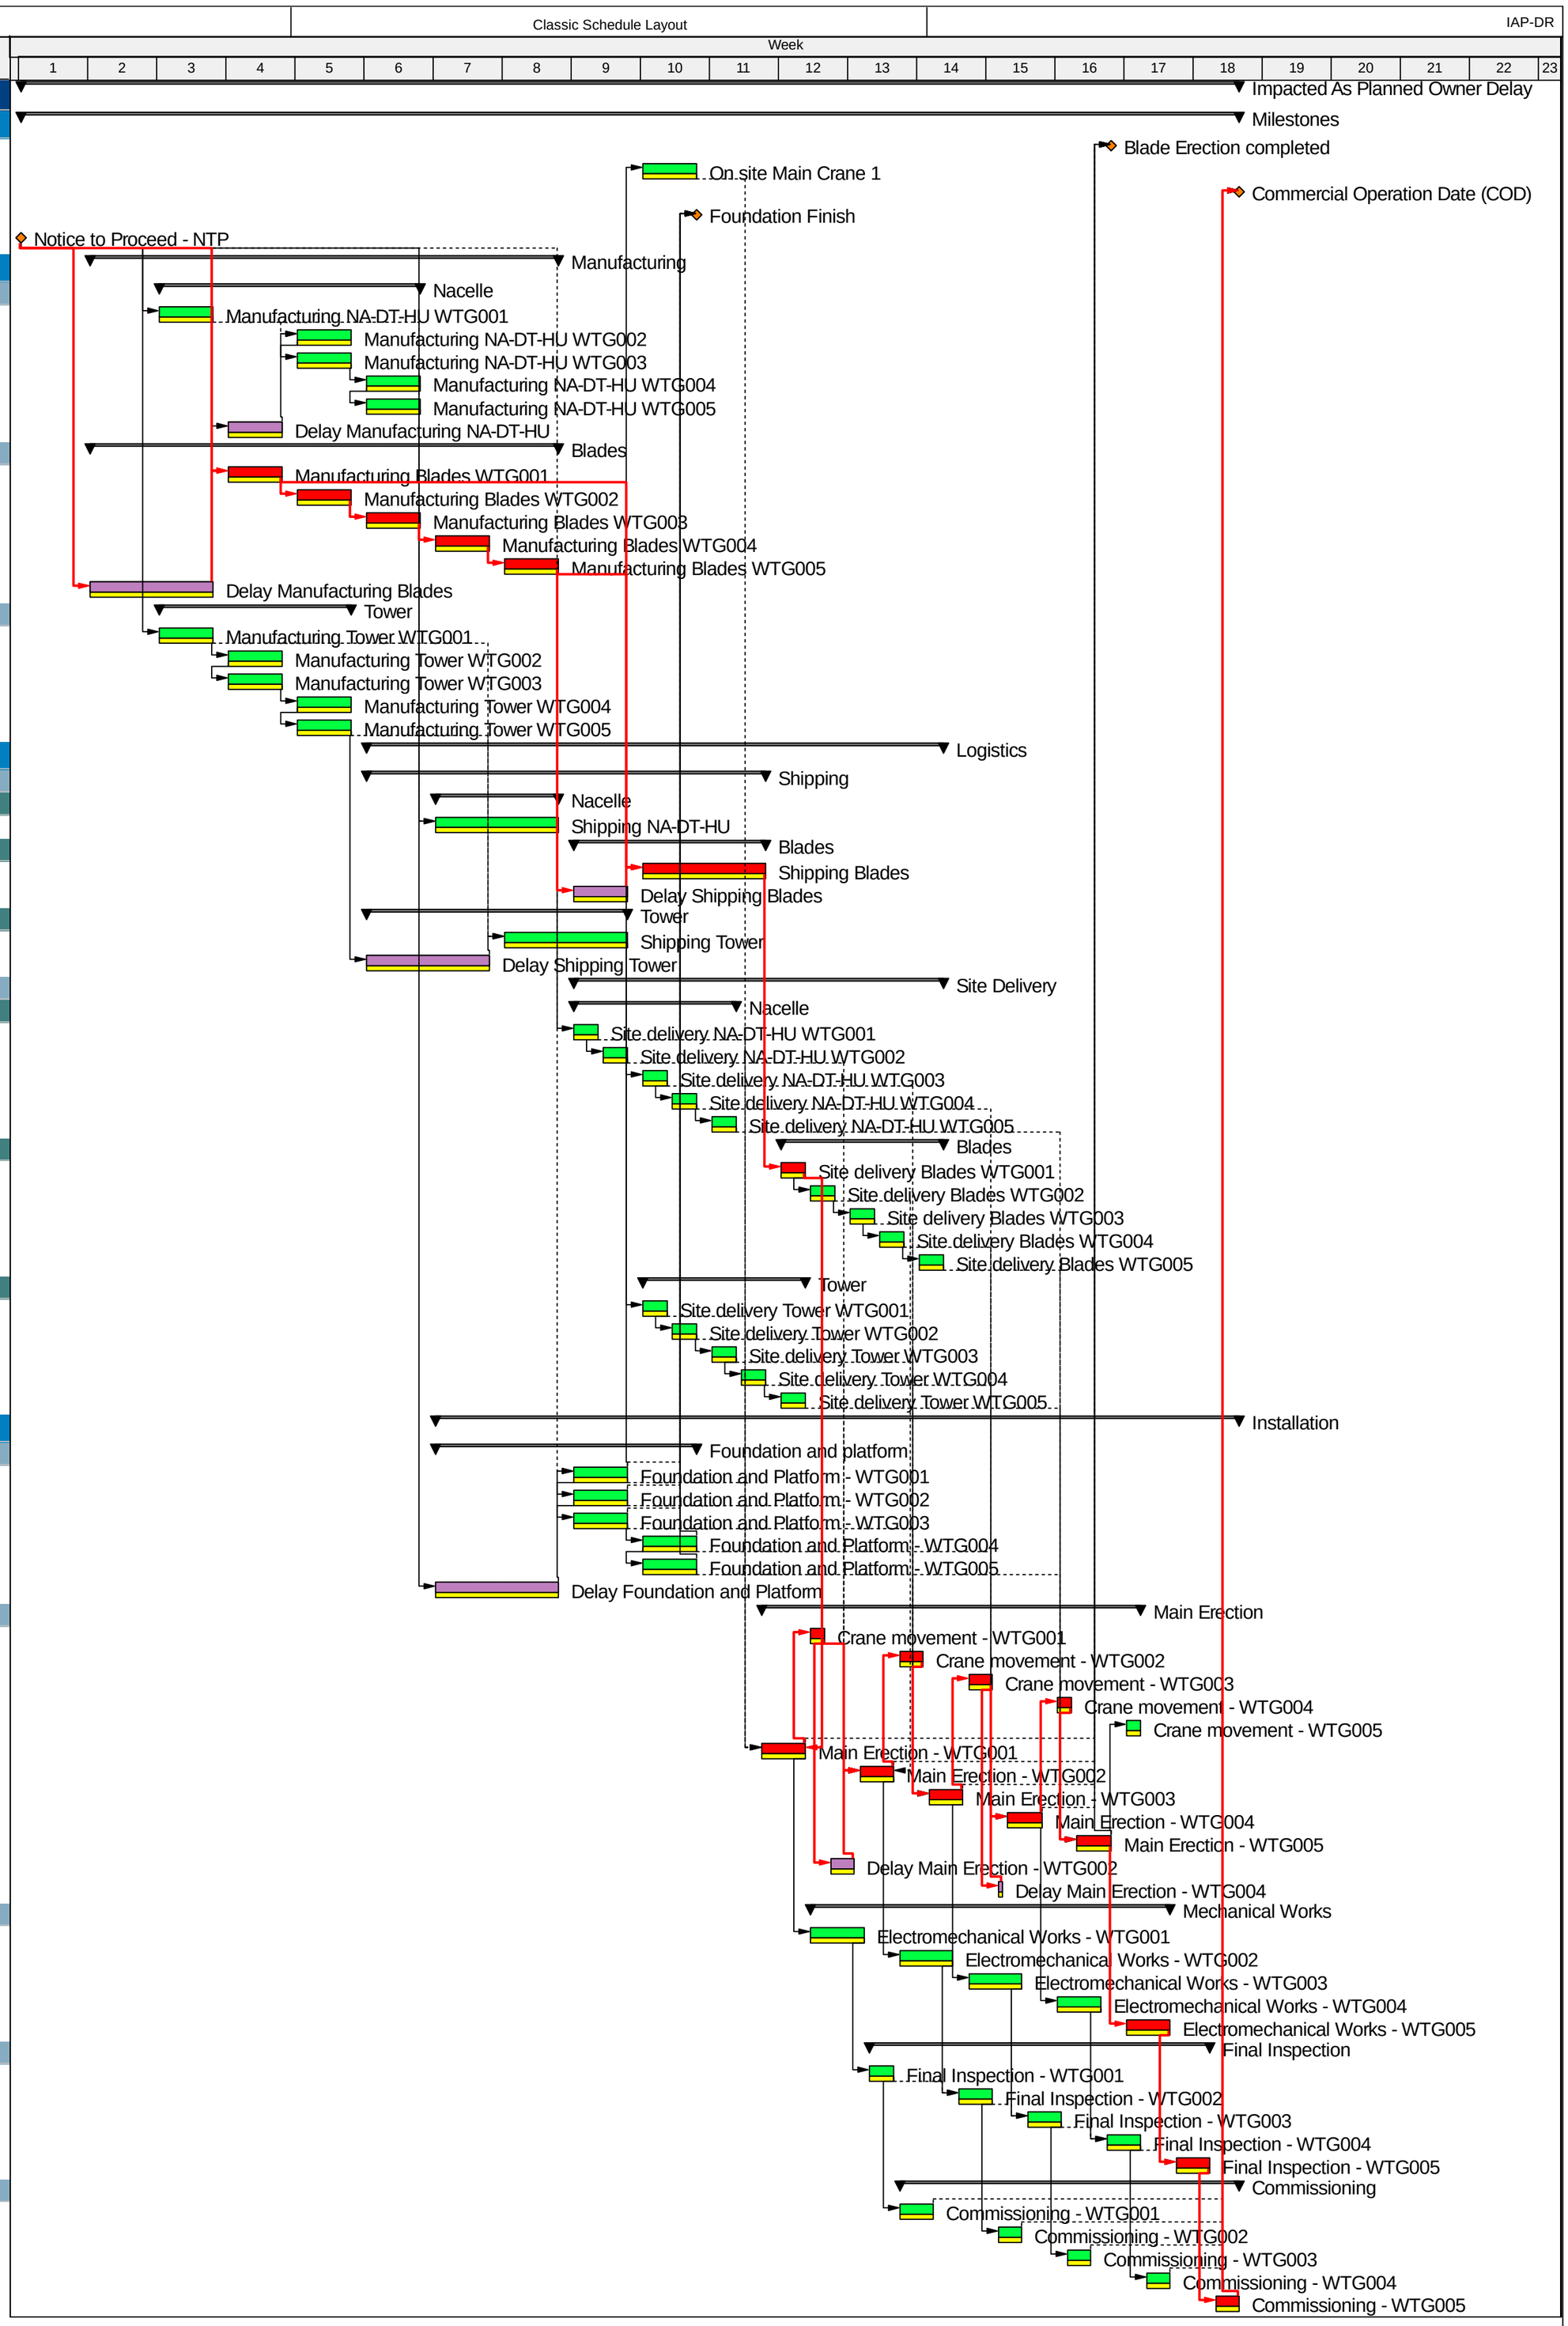

Actual Work | Critical Remaining Work | Milestone
Remaining Work | Primary Baseline | DELAY

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
