Activity ID	Start	Finish	BL Project Finish
Time Slice	02-Ja	25-Ap	12-Ap
Milestones	02-Ja	25-Ap	12-Ap
BLFI		12-Ap	30-Ma
CMCR001	20-Fe	25-Fe	25-Fe
COD		25-Ap	12-Ap
FOUNDF		25-Fe	25-Fe
NTP	02-Ja		
Manufactu	09-Ja	25-Fe	11-Fe
Nacelle	16-Ja	18-Fe	04-Fe
MANA001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MANA002	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA003	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA004	06-Fe	11-Fe	04-Fe
MANA005	13-Fe	18-Fe	04-Fe
MANADR	23-Ja	28-Ja	
Blades	09-Ja	25-Fe	11-Fe
MABL001	23-Ja	28-Ja	14-Ja
MABL002	30-Ja	04-Fe	21-Ja
MABL003	06-Fe	11-Fe	28-Ja
MABL004	13-Fe	18-Fe	04-Fe
MABL005	20-Fe	25-Fe	11-Fe
MABLDR2	09-Ja	21-Ja	
Tower	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MAST002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Logistics	06-Fe	29-Ma	15-Ma
Shipping	06-Fe	11-Ma	25-Fe
Nacelle	20-Fe	04-Ma	18-Fe
SHNA001	20-Fe	04-Ma	18-Fe
Blades	27-Fe	11-Ma	25-Fe
SHBL001	27-Fe	11-Ma	25-Fe
Tower	06-Fe	18-Fe	18-Fe
SHST001	06-Fe	18-Fe	18-Fe
Site Delivery	20-Fe	29-Ma	15-Ma
Nacelle	06-Ma	22-Ma	08-Ma
SDNA001	06-Ma	08-Ma	22-Fe
SDNA002	09-Ma	11-Ma	25-Fe
SDNA003	13-Ma	15-Ma	01-Ma
SDNA004	16-Ma	18-Ma	04-Ma
SDNA005	20-Ma	22-Ma	08-Ma
Blades	13-Ma	29-Ma	15-Ma
SDBL001	13-Ma	15-Ma	01-Ma
SDBL002	16-Ma	18-Ma	04-Ma
SDBL003	20-Ma	22-Ma	08-Ma
SDBL004	23-Ma	25-Ma	11-Ma
SDBL005	27-Ma	29-Ma	15-Ma
Tower	20-Fe	08-Ma	08-Ma
SDST001	20-Fe	22-Fe	22-Fe
SDST002	23-Fe	25-Fe	25-Fe
SDST003	27-Fe	01-Ma	01-Ma
SDST004	02-Ma	04-Ma	04-Ma
SDST005	06-Ma	08-Ma	08-Ma
Installation	13-Fe	25-Ap	12-Ap
Foundation a	13-Fe	25-Fe	25-Fe
FNPL001	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL002	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL003	13-Fe	18-Fe	18-Fe
FNPL004	20-Fe	25-Fe	25-Fe
FNPL005	20-Fe	25-Fe	25-Fe
Main Erectio	11-Ma	14-Ap	01-Ap
INDS001	16-Ma	17-Ma	04-Ma
INDS002	23-Ma	24-Ma	11-Ma
INDS003	30-Ma	31-Ma	18-Ma
INDS004	06-Ap	07-Ap	25-Ma
INDS005	13-Ap	14-Ap	01-Ap
INTE001	11-Ma	15-Ma	02-Ma
INTE002	18-Ma	22-Ma	09-Ma
INTE003	25-Ma	29-Ma	16-Ma
INTE004	01-Ap	05-Ap	23-Ma
INTE005	08-Ap	12-Ap	30-Ma
Mechanical W	16-Ma	18-Ap	05-Ap
INMW001	16-Ma	21-Ma	08-Ma
INMW002	22-Ma	27-Ma	15-Ma
INMW003	30-Ma	04-Ap	22-Ma
INMW004	06-Ap	11-Ap	29-Ma
INMW005	13-Ap	18-Ap	05-Ap
Final Inspect	22-Ma	21-Ap	08-Ap
INSP001	22-Ma	24-Ma	11-Ma
INSP002	28-Ma	30-Ma	18-Ma
INSP003	05-Ap	07-Ap	25-Ma
INSP004	12-Ap	14-Ap	01-Ap
INSP005	19-Ap	21-Ap	08-Ap
Commission	25-Ma	25-Ap	12-Ap
COMM001	25-Ma	28-Ma	15-Ma
COMM002	31-Ma	03-Ap	22-Ma
COMM003	08-Ap	11-Ap	29-Ma
COMM004	15-Ap	18-Ap	05-Ap
COMM005	22-Ap	25-Ap	12-Ap

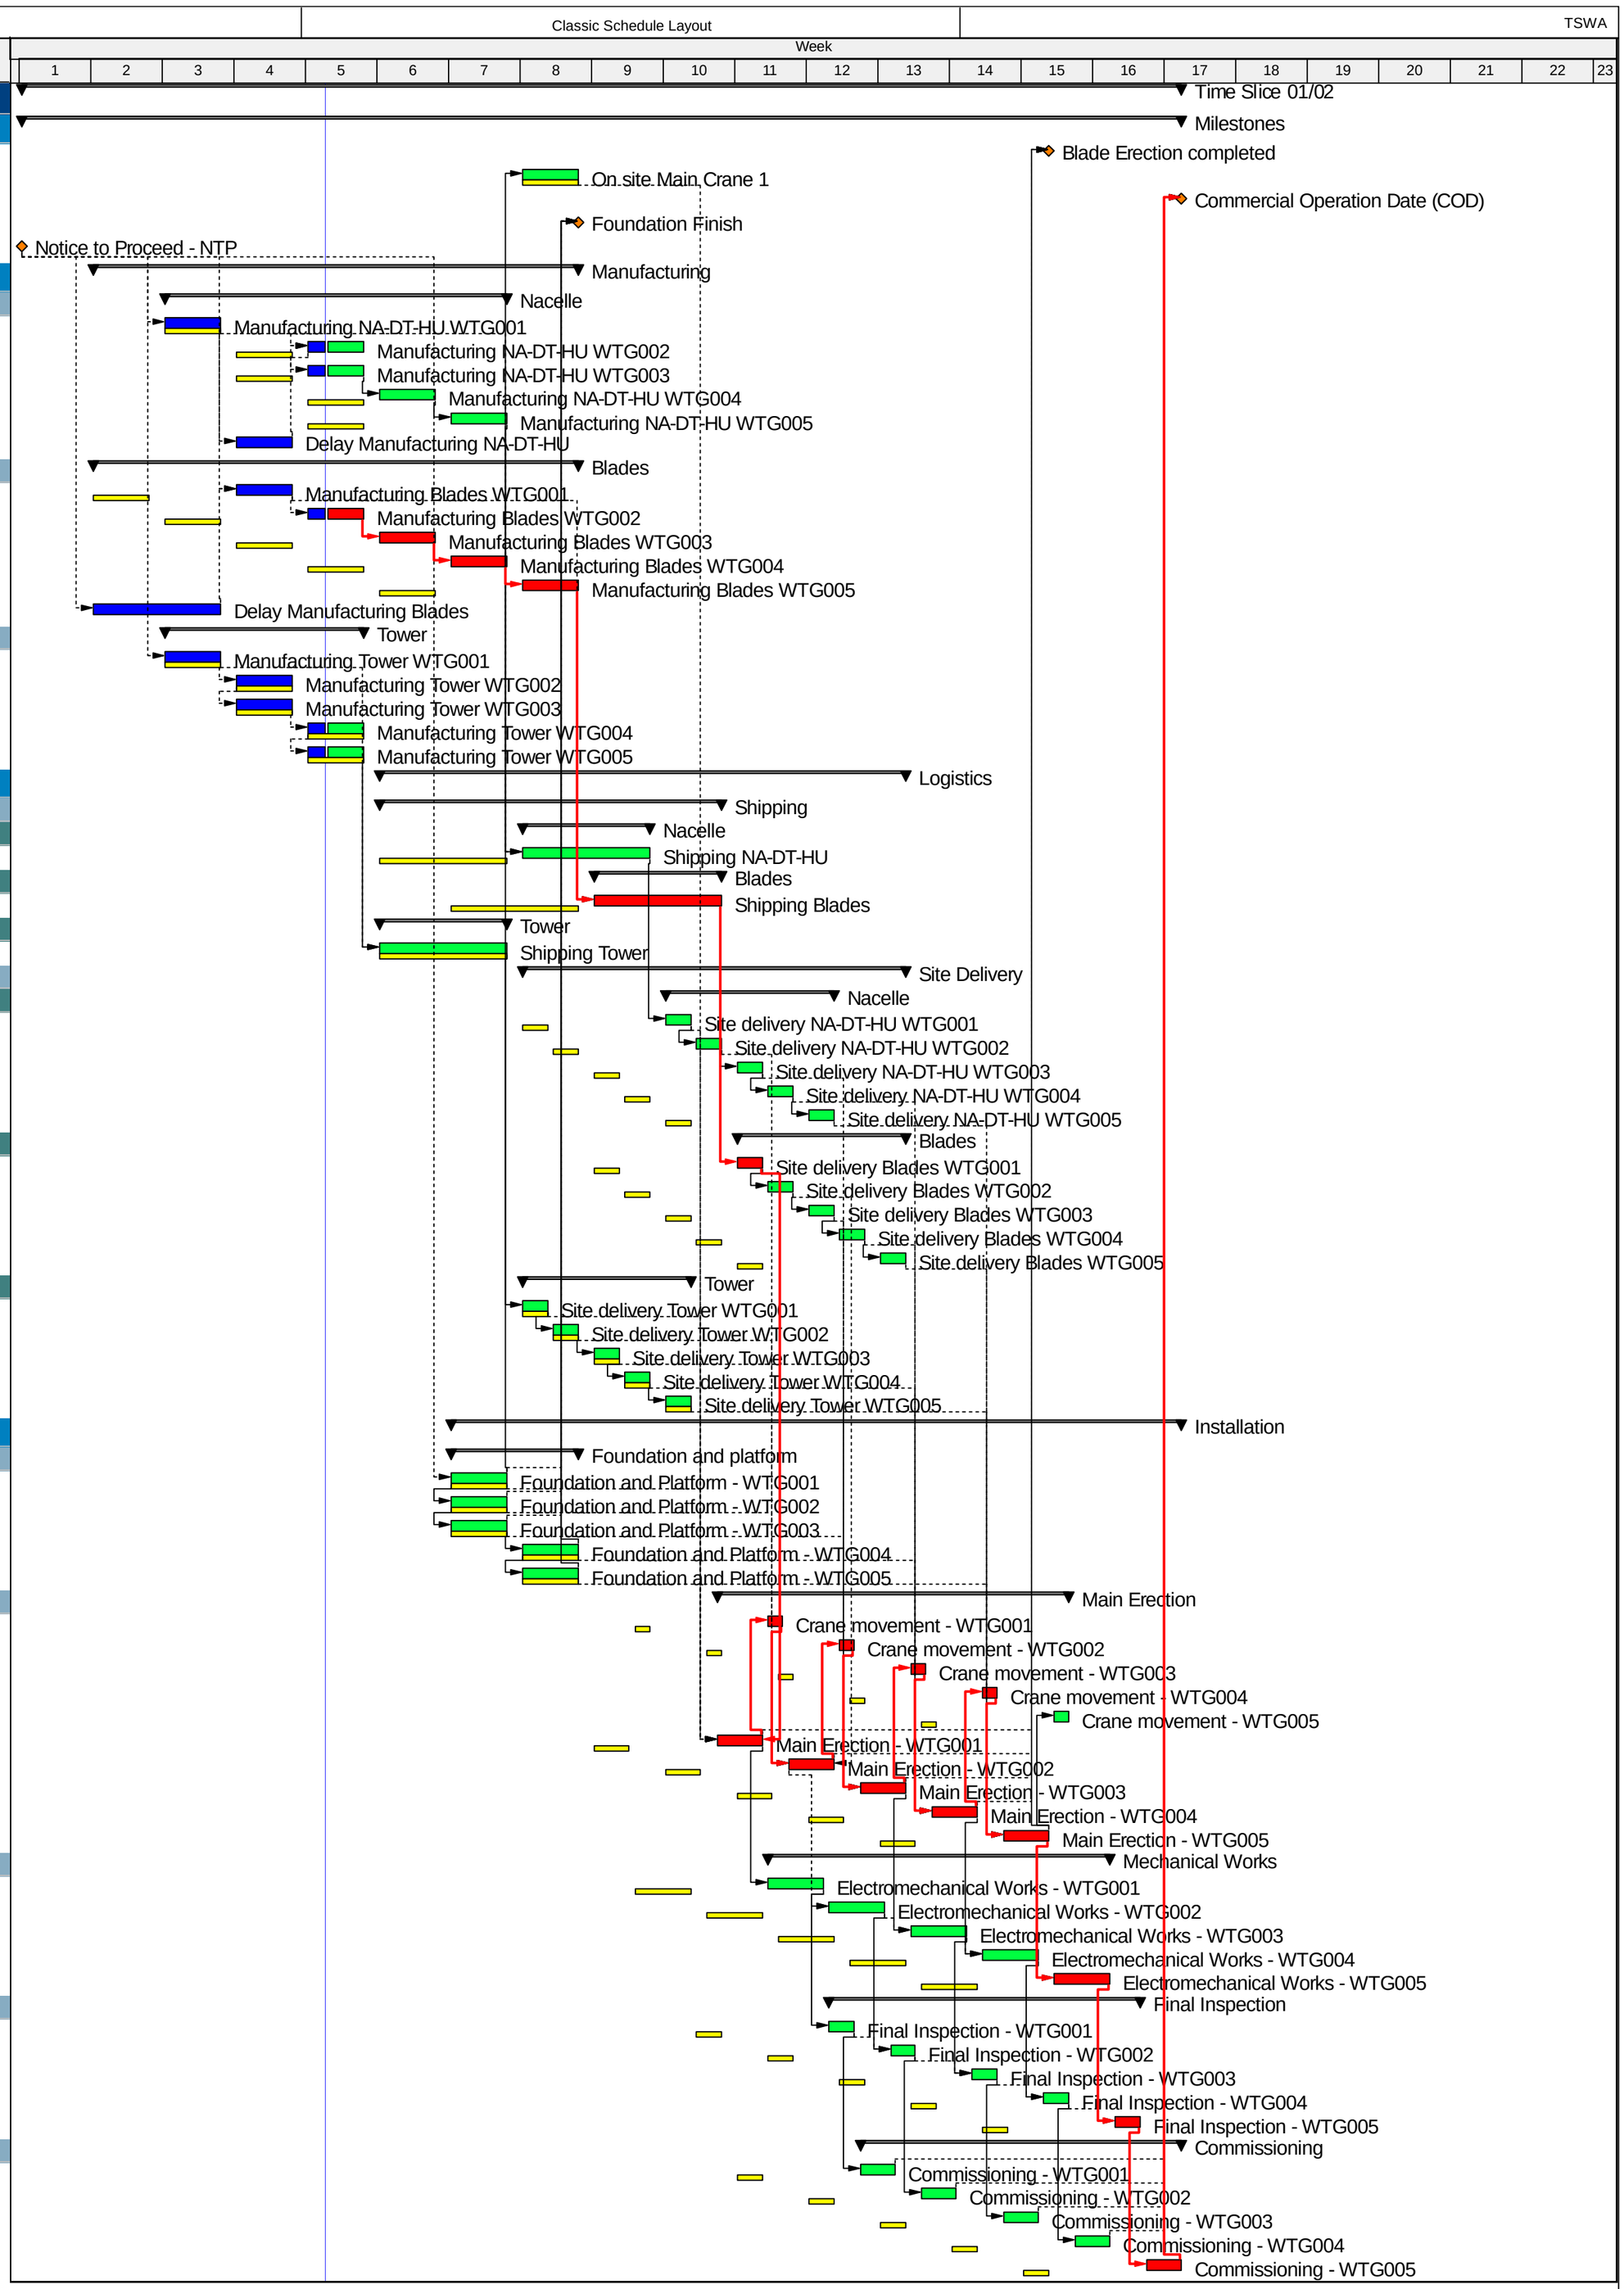

Actual Work | Critical Remaining Work | Milestone
Remaining Work | Primary Baseline | DELAY

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
