Activity ID	Start	Finish	BL Project Finish
Time Slice	02-Ja	02-M	12-Ap
Milestones	02-Ja	02-M	12-Ap
BLFI		19-Ap	30-Ma
CMCR001	06-Ma	11-Ma	25-Fe
COD		02-M	12-Ap
FOUNDF		18-M	25-Fe
NTP	02-Ja		
Manufactu	09-Ja	25-Fe	11-Fe
Nacelle	16-Ja	18-Fe	04-Fe
MANA001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MANA002	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA003	30-Ja	04-Fe	28-Ja
MANA004	06-Fe	11-Fe	04-Fe
MANA005	13-Fe	18-Fe	04-Fe
MANADR	23-Ja	28-Ja	
Blades	09-Ja	25-Fe	11-Fe
MABL001	23-Ja	28-Ja	14-Ja
MABL002	30-Ja	04-Fe	21-Ja
MABL003	06-Fe	11-Fe	28-Ja
MABL004	13-Fe	18-Fe	04-Fe
MABL005	20-Fe	25-Fe	11-Fe
MABLDR2	09-Ja	21-Ja	
Tower	16-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST001	16-Ja	21-Ja	21-Ja
MAST002	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST003	23-Ja	28-Ja	28-Ja
MAST004	30-Ja	04-Fe	04-Fe
MAST005	30-Ja	04-Fe	04-Fe
Logistics	06-Fe	05-Ap	15-Ma
Shipping	06-Fe	18-M	25-Fe
Nacelle	20-Fe	04-M	18-Fe
SHNA001	20-Fe	04-M	18-Fe
Blades	27-Fe	18-M	25-Fe
SHBL001	06-Ma	18-M	25-Fe
SHBLDR	27-Fe	04-M	
Tower	06-Fe	04-M	18-Fe
SHST001	20-Fe	04-M	18-Fe
SHSTDR	06-Fe	18-Fe	
Site Delivery	06-Ma	05-Ap	15-Ma
Nacelle	06-Ma	22-M	08-Ma
SDNA001	06-Ma	08-M	22-Fe
SDNA002	09-Ma	11-Ma	25-Fe
SDNA003	13-Ma	15-M	01-Ma
SDNA004	16-Ma	18-M	04-Ma
SDNA005	20-Ma	22-M	08-Ma
Blades	20-Ma	05-Ap	15-Ma
SDBL001	20-Ma	22-M	01-Ma
SDBL002	23-Ma	25-M	04-Ma
SDBL003	27-Ma	29-M	08-Ma
SDBL004	30-Ma	01-Ap	11-Ma
SDBL005	03-Ap	05-Ap	15-Ma
Tower	06-Ma	15-M	08-Ma
SDST001	06-Ma	08-M	22-Fe
SDST002	06-Ma	08-M	25-Fe
SDST003	09-Ma	11-Ma	01-Ma
SDST004	09-Ma	11-Ma	04-Ma
SDST005	13-Ma	15-M	08-Ma
Installation	13-Fe	02-M	12-Ap
Foundation a	13-Fe	18-M	25-Fe
FNPL001	27-Fe	04-M	18-Fe
FNPL002	27-Fe	04-M	18-Fe
FNPL003	06-Ma	11-Ma	18-Fe
FNPL004	13-Ma	18-M	25-Fe
FNPL005	13-Ma	18-M	25-Fe
FNPLDR5	13-Fe	25-Fe	
Main Erectio	18-Ma	21-Ap	01-Ap
INDS001	23-Ma	24-M	04-Ma
INDS002	30-Ma	31-M	11-Ma
INDS003	06-Ap	07-Ap	18-Ma
INDS004	13-Ap	14-Ap	25-Ma
INDS005	20-Ap	21-Ap	01-Ap
INTE001	18-Ma	22-M	02-Ma
INTE002	25-Ma	29-M	09-Ma
INTE003	01-Ap	05-Ap	16-Ma
INTE004	08-Ap	12-Ap	23-Ma
INTE005	15-Ap	19-Ap	30-Ma
Mechanical W	23-Ma	25-Ap	05-Ap
INMW001	23-Ma	28-M	08-Ma
INMW002	29-Ma	03-Ap	15-Ma
INMW003	06-Ap	11-Ap	22-Ma
INMW004	13-Ap	18-Ap	29-Ma
INMW005	20-Ap	25-Ap	05-Ap
Final Inspect	29-Ma	28-Ap	08-Ap
INSP001	29-Ma	31-M	11-Ma
INSP002	04-Ap	06-Ap	18-Ma
INSP003	12-Ap	14-Ap	25-Ma
INSP004	19-Ap	21-Ap	01-Ap
INSP005	26-Ap	28-Ap	08-Ap
Commission	01-Ap	02-M	12-Ap
COMM001	01-Ap	04-Ap	15-Ma
COMM002	07-Ap	10-Ap	22-Ma
COMM003	15-Ap	18-Ap	29-Ma
COMM004	22-Ap	25-Ap	05-Ap
COMM005	29-Ap	02-M	12-Ap

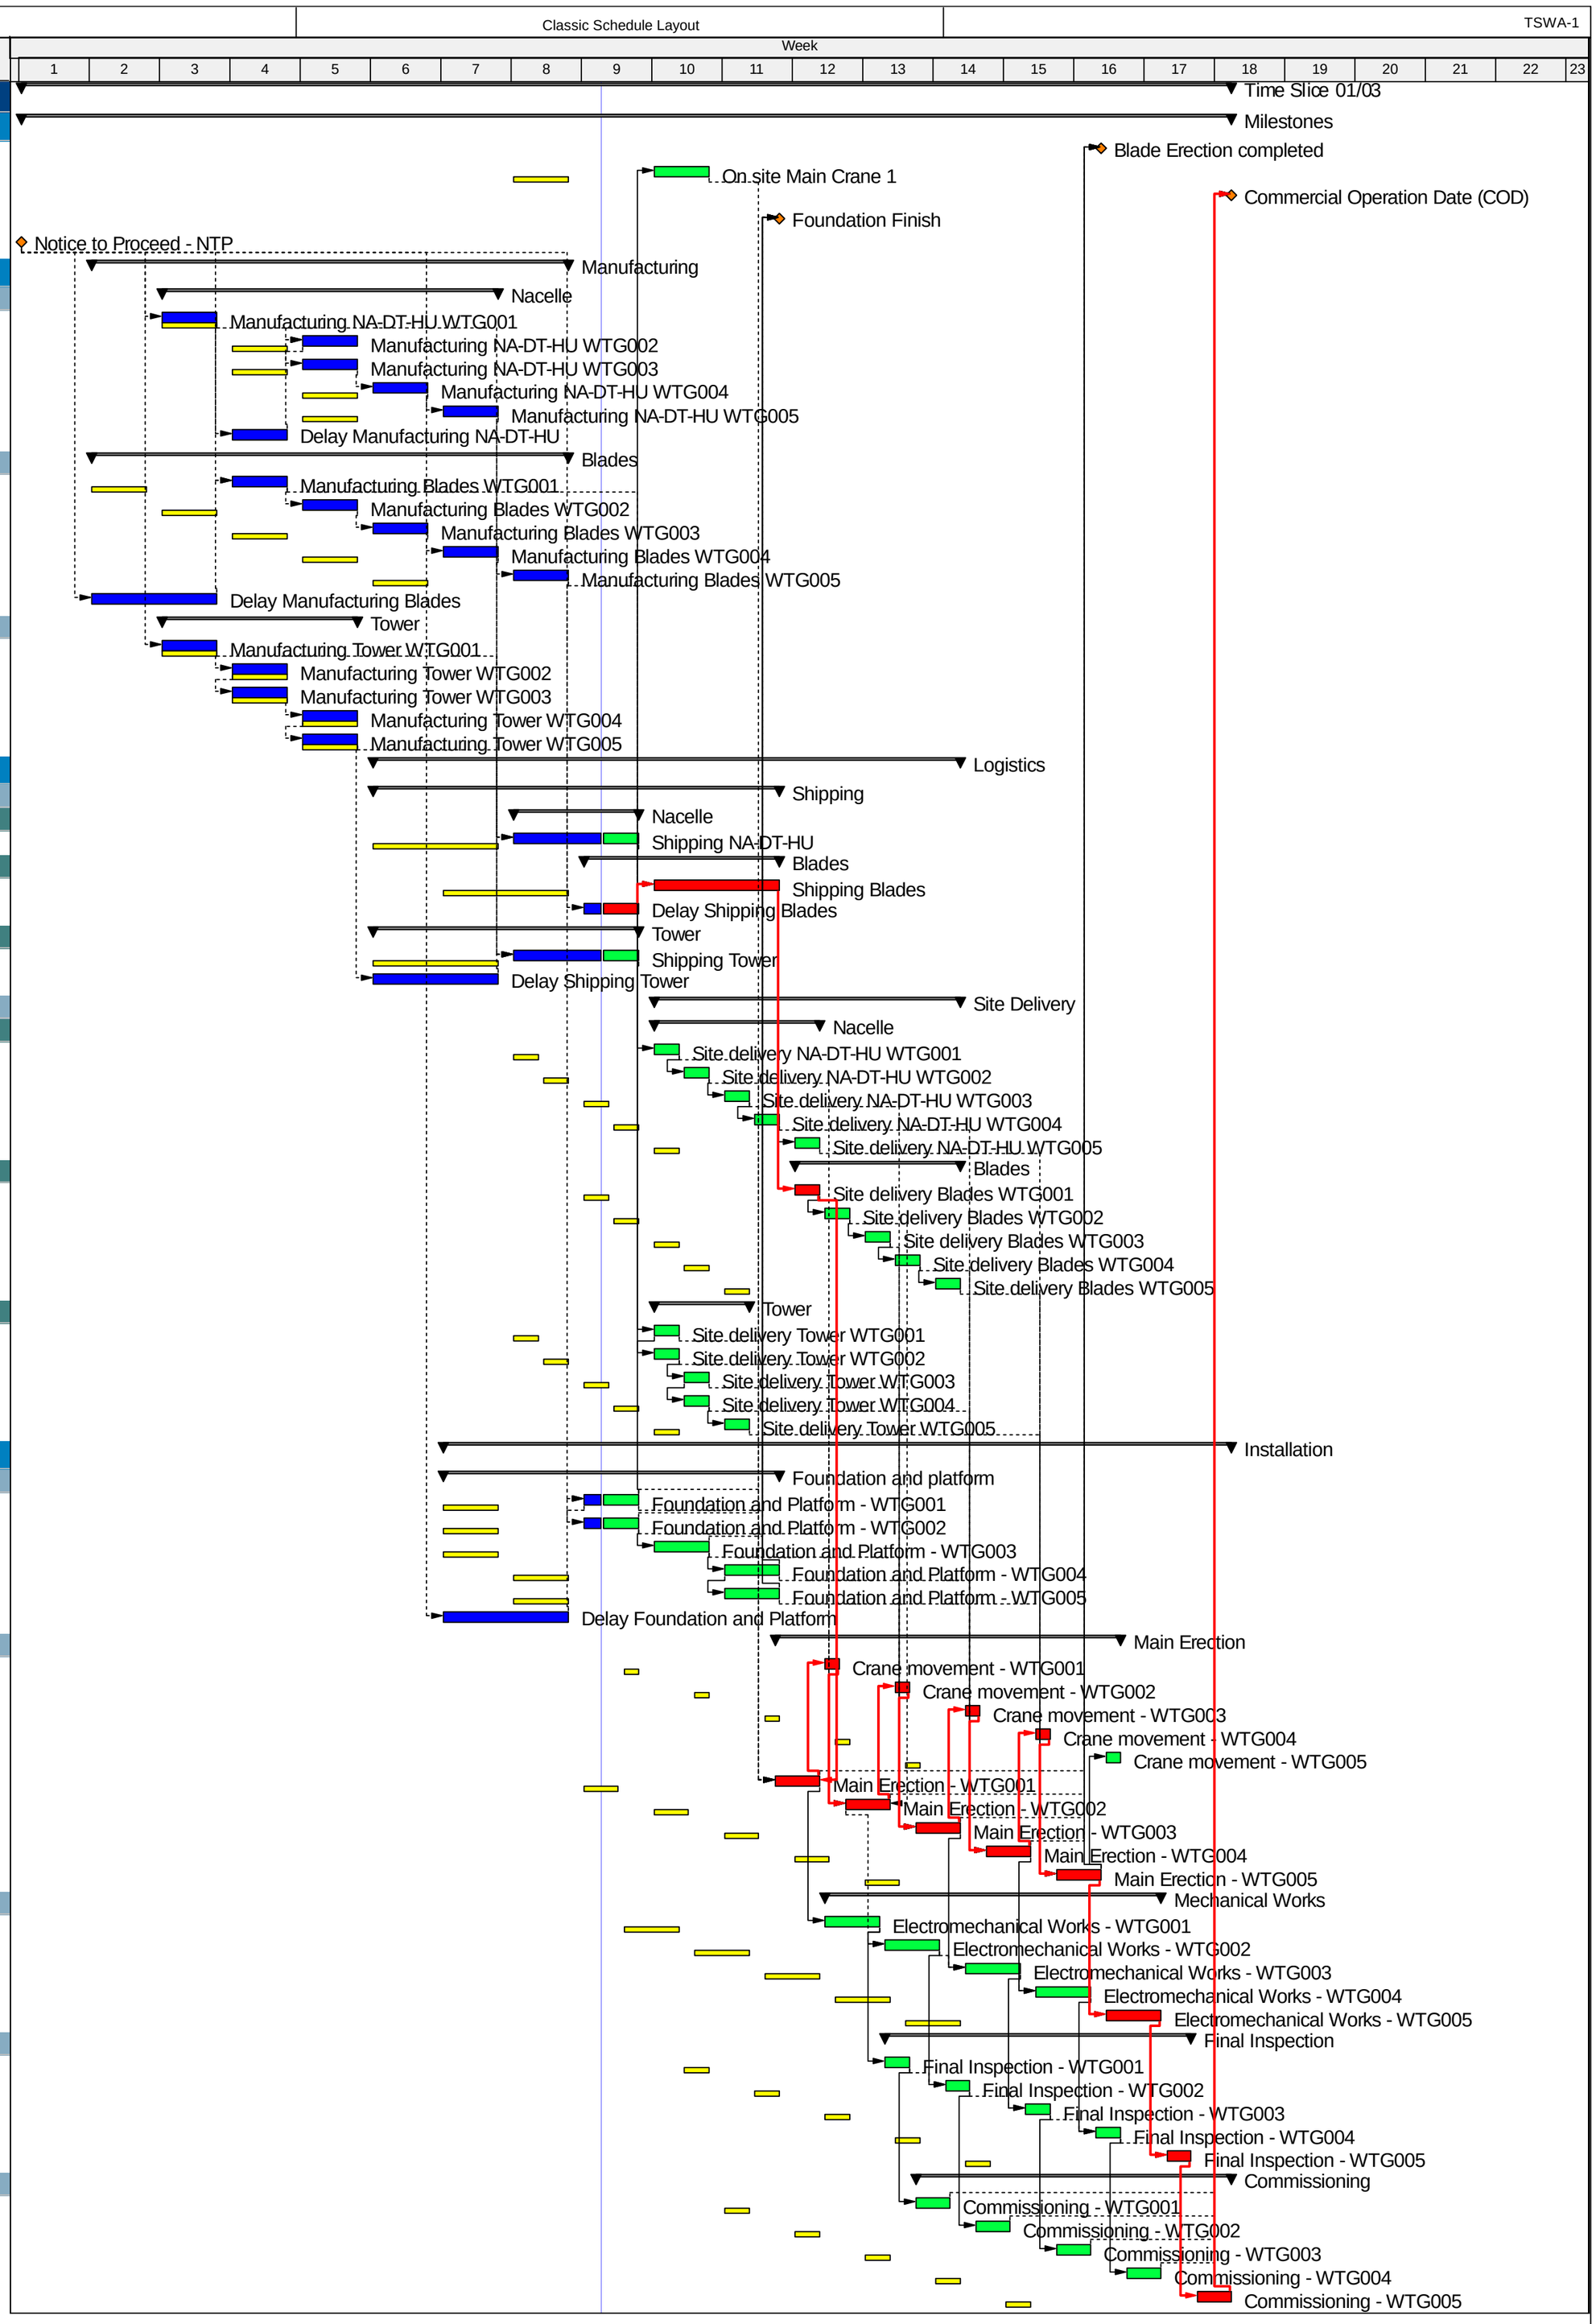

Actual Work | Critical Remaining Work | Milestone
Remaining Work | Primary Baseline | DELAY

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation
